



環境ハーモニー 人と大川の調和を育む  
株式会社松本組

# 府谷川 砂防えん堤工事

## MAZMOTOだより

加保地区

INFORMATION

～Vol.5～

平成29年9月5日発行

### はじめに

9月に入り、ようやくしのぎやすい季節となりましたが、加保地区のみなさまはいかがお過ごしでしょうか？これからの季節は、朝夕冷え込んでまいりますのでお体にはお気をつけてください。

早期完成を目標に取り組みで参りました府谷川砂防えん堤工事もうまく9月末で工事完成予定となっております。この数ヶ月間に渡り工事に際し皆様からの温かいご支援とご賛同の下ここまでやってこられました。後少しとなりましたが、最後まで気を引き締めて安全に工事を進めて参りますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。


### 工事の進捗状況

8月度は、下記の②副えん堤と③ブロック積擁壁が完了しました。9月度は③水叩きと④取付水路工を構築していきます。最後の構造物になる取付水路が完了した後に工事用道路を撤去していき、現況復旧を行っていきます。今月は残土搬出や生コン車、資機材の搬出用トラック・ダンプの出入りも多くありますので、最後まで交通災害ないよう交通誘導員の適正配置、運行ルールを厳守させ走行致しますので、ご協力の程よろしくお願い致します。

工事だよりの掲載は今月号が最後になります。5月からこのだよりを掲載し、区長様はじめ住民の皆様にご覧して見て頂き少しでもお役に立てたなら幸いです。工事はまだ完了していませんが、ここまで工事を進めるにあたり皆さまからの温かいお言葉やお心づかいに感謝いたします。ありがとうございました。

### 現場の進捗状況写真

完成イメージ図

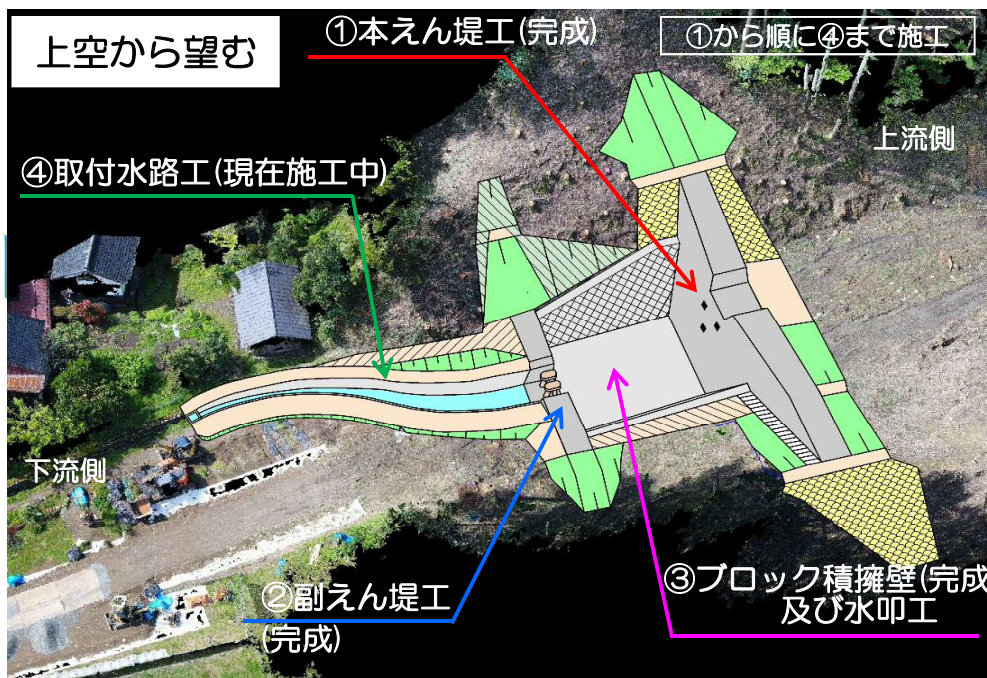

今後の工事につきましては、次に示す工程表に基づき進めてまいります。

①から順に進めて参ります

工種	年月	平成29年									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
仮設工		■	■								
①本えん堤工				■	■	■					
②副えん堤工						■	■				
③ブロック積擁壁及び水叩工							■	■			
④取付水路工								■			
生コン車搬入台数		-	-	30	170	70	30	22	-		

※本表は予定であり、変更となる場合もあります。

今後も引き続き工事の進捗状況につきまして、ご報告してまいります。

なお、詳細は、右記までお問い合わせください。

■(株)松本組 府谷川砂防えん堤工事作業所

電話：079-660-2569へ

本新聞は毎月1回発行予定です。

★府谷川砂防えん堤工事だよりは、(株)松本組ホームページからも閲覧できます。 <http://mazmotogumi.co.jp/>
