MAZMOTO
環境ハーモニー 人と大地の調和を育む
株式会社松本組

(急)由良地区 急傾斜地 崩壊防止工事
MAZMOTOだより

由良地区 INFORMATION

～Vol.3～
平成30年2月3日発行

❐はじめに

まだまだ寒さが厳しい日々が続いておりますが、由良地区の皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。今年はインフルエンザが流行しておりますので、対策をとって頂きましてお体にはご自愛ください。

工事の進捗状況のお知らせ

当月の出来高としましては、進捗率(1月末現在)25.1%となっております。1月度は擁壁コンクリートの構築と崩壊土砂防護柵を構築するための足場の組立を行っておりました。擁壁コンクリートにつきましては約80%が完了しております。崩壊土砂防護柵の足場は約60%が完成しており、2月中旬で完成する予定となっております。その後、崩壊土砂防護柵(107m区間)本工事でもある支柱の設置を行っていきます。その際、防護柵の支柱が長尺物のため、大型トラックにて市道の特車ルートを使用し通行致します。2月度も大型車両の出入りがありますので十分な安全対策を講じて誘導致しますのでご協力の程よろしくお願い致します。

平成30年1月度　空撮写真

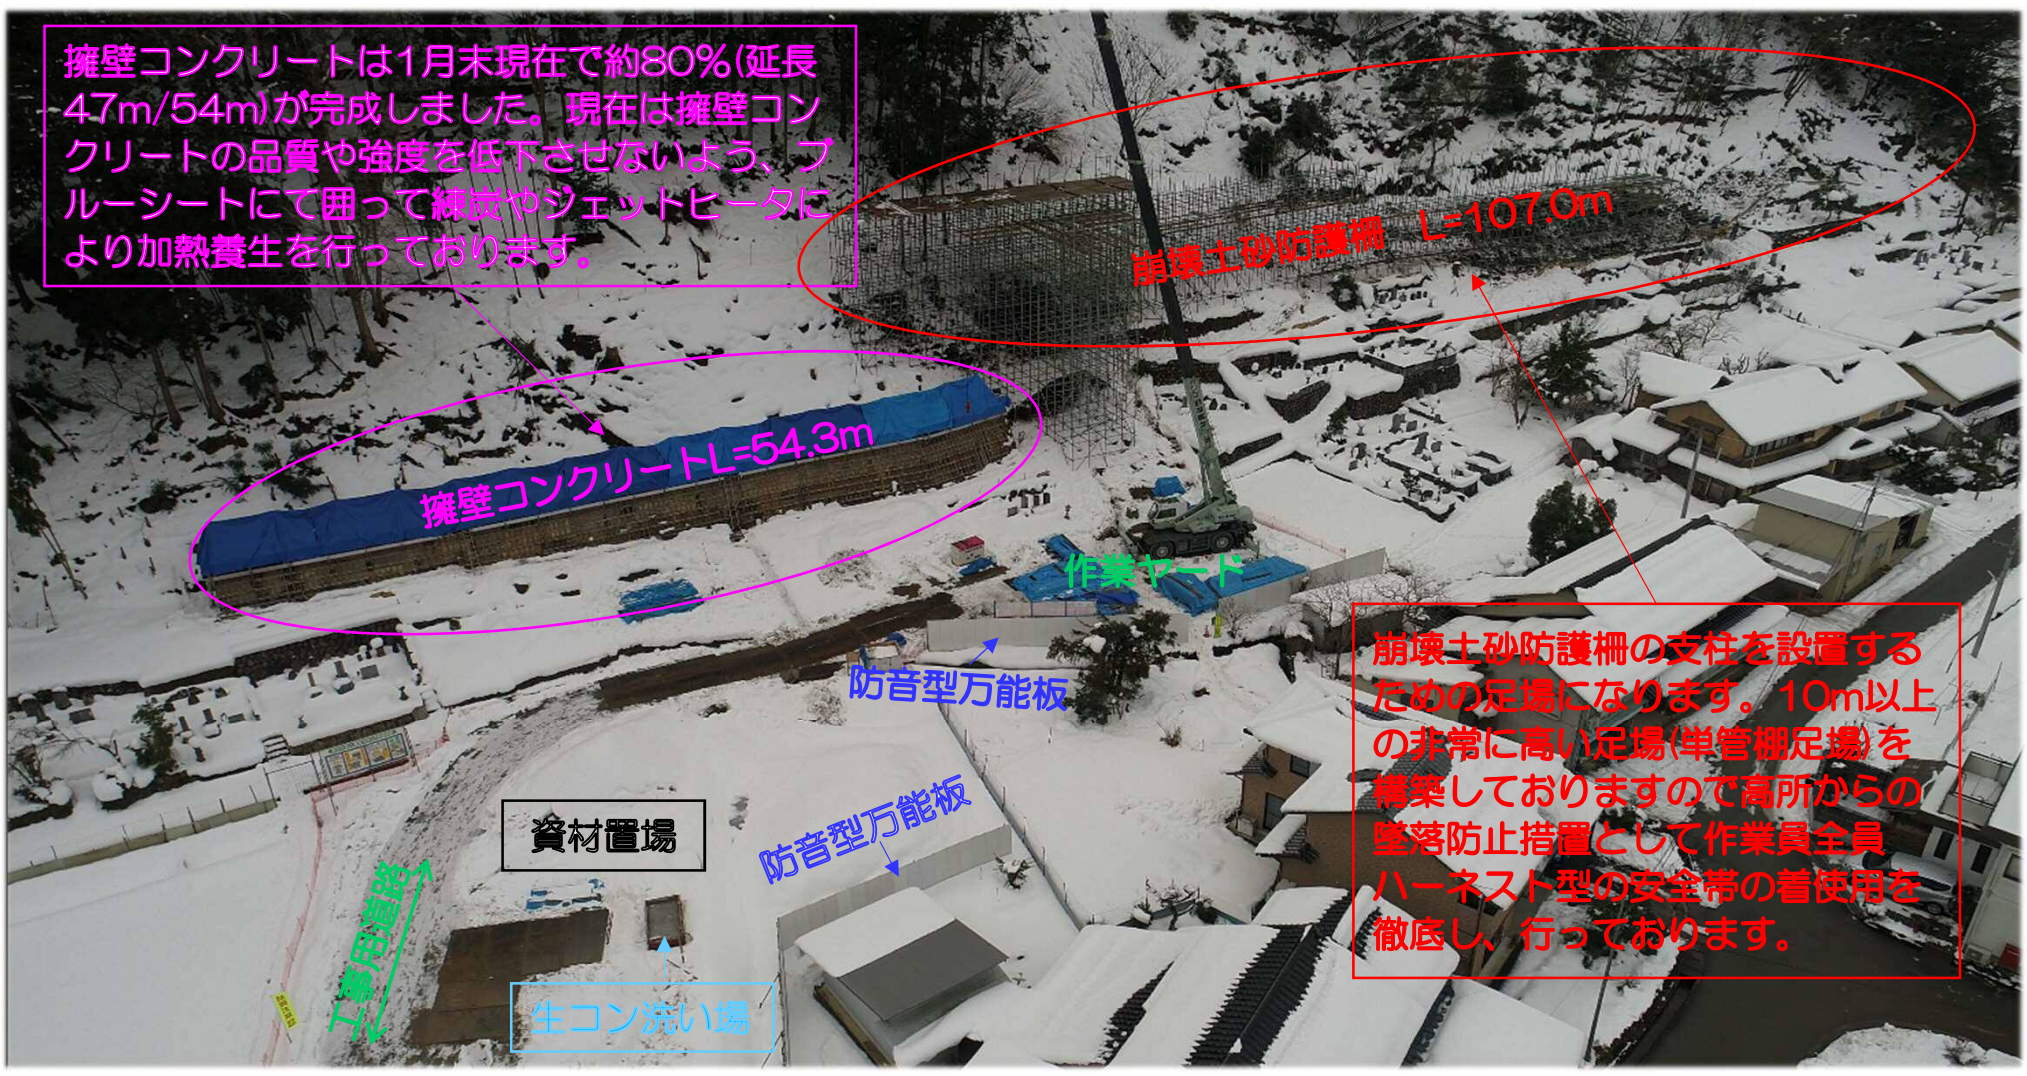

今後の工事のお知らせ

今後の工事につきましては、次に示す工程表に基づき進めてまいります。

工種＼年月	平成29年			平成30年			
	10	11	12	1	2	3	4
仮設工							
擁壁工コンクリート							
崩壊土砂防護柵工							
生コン車搬入台数	-	-	30	30	5	15	1

※本表は予定であり、変更となる場合もあります。

今後も引き続き工事の進捗状況につきまして、ご報告してまいります。
なお、詳細は、右記までお問い合わせください。

■(株)松本組　由良地区急傾斜地崩壊防止工事作業
電話：079-660-2569へ

本新聞は毎月1回発行予定です。

★急傾斜地崩壊防止工事だよりは、㈱松本組ホームページからも閲覧できます。http://mazmotogumi.co.jp/
